

Relatório de Sprint – 2

Título do Projeto: Projeto Conecte

Grupo: Arthur Alves Brito, Giovanna Giannini, Leonardo Santos Filho, Luan Neves, Lucas Pereira, Pedro Henrique Lopes, Ruy Paiva

Período da Sprint: 23/04/26 - 06/05/26

Scrum Master: Luan Neves

Repositório Git: <https://github.com/LuanNeves09/Projeto-de-Extensao-2026-1.git>

Commit da Entrega: 3a3b24b1631ddc940cbcd2296056d7b0a2f5f860

1. Sprint Backlog


Tabela de acompanhamento das histórias da sprint.

Task Name	Assigned to	Start	Due	↑ Bucket	Status	Priority	Labels
Aula 1	UP +3		5/2/2026	Sprint 02: 23/...	Completed	Important	10 - Effort X Aula X
Assinatura do termo de uso de imagem	Giovanna ...			Sprint 02: 23/...	Completed	Important	2 - Effort X Organização X
Segunda triagem dos inscritos	UP +5			Sprint 02: 23/...	Completed	Important	2 - Effort X Organização X
Criação dos slides para a aula 1	Lucas Pere...		5/2/2026	Sprint 02: 23/...	Completed	Important	10 - Effort X Aula X
Criar termo de uso de imagem	Giovanna ...			Sprint 02: 23/...	Completed	Medium	5 - Effort X Organização X
Criação dos slides para a aula 2	Lucas Pere...		5/9/2026	Sprint 02: 23/...	Completed	Important	10 - Effort X Aula X
Enviar mensagens com instruções do curso	UP +4			Sprint 02: 23/...	Completed	Medium	2 - Effort X Organização X
Organizar primeira aula	UP L P			Sprint 02: 23/...	Completed	Important	6 - Effort X Aula X
Escanear termos de uso de imagem assinados e guar...	Giovanna ...			Sprint 02: 23/...	Completed	Medium	3 - Effort X

Observação:

Status: *Todos os itens foram concluídos.*

2. Burndown Chart

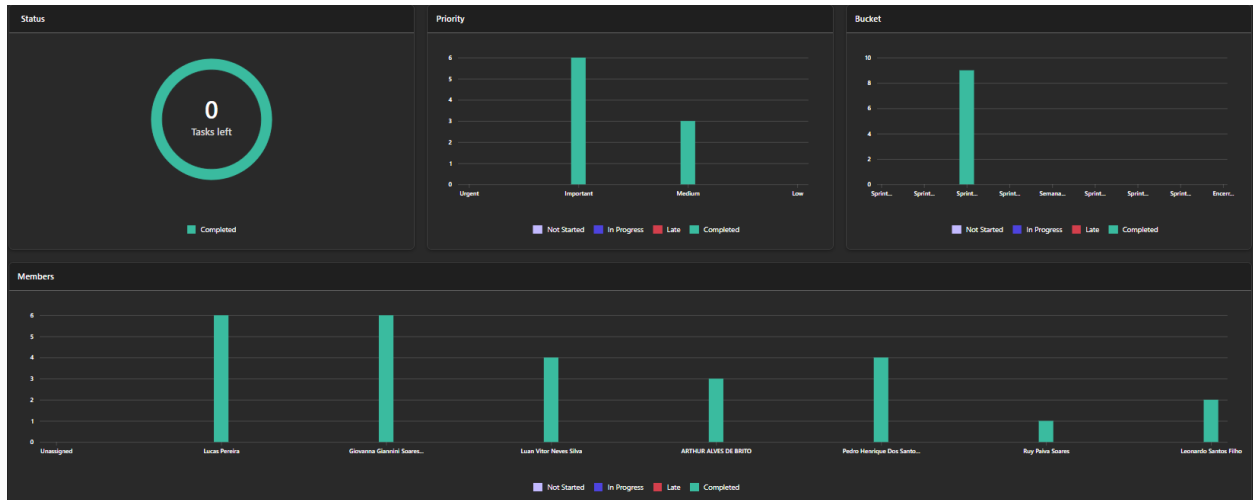

Legenda:

Burndown – Sprint 2

3. Análise do Burndown

O gráfico demonstra que a equipe conseguiu concluir todas as atividades até o fechamento da sprint (06/05/2026), garantindo a entrega principal da aula 1 e documentações iniciais.

4. Artefatos Produzidos

- Slides da Aula 1 e Aula 2: Criação dos materiais didáticos para dar suporte ao ensino presencial das metodologias ativas. [Link](#)
- Termo de Uso de Imagem: Documento gerado, aplicado presencialmente e digitalizado no Drive e repositório do GitHub da equipe. [Link Para Evidência](#)
- Listagem da 2ª Triagem e Controle de Mensagens: Relação dos professores selecionados e contatados com instruções de acesso ao projeto. [Link Para Evidência](#)

- Execução da Aula 1: A primeira oficina prática conduzida com a comunidade. [Link Para Evidência](#)
-

5. Atualização com o Parceiro

- Data do contato e formato: Contatos assíncronos ao longo da sprint (e-mail e mensagens de texto via whatsapp).
 - Pauta e Feedback: O foco foi o disparo de mensagens para comunicar as instruções oficiais de início do curso aos professores selecionados na segunda triagem. O engajamento com as mensagens foi essencial para confirmar o necessário para a execução da aula 1.
-

6. Participação do Calouro

Os calouros Arthur Alves e Ruy Paiva fazem parte da equipe. Durante a Sprint 2, Arthur Alves de Brito e Ruy Paiva estiveram diretamente alocados e participaram do **Envio de mensagens com instruções do curso** aos beneficiários, e o Arthur participou ativamente da execução da **aula 1**.

7. Impedimentos e Desvios

Não houveram problemas quanto ao que foi proposto pelo grupo para esta sprint.

8. Retrospectiva

O que funcionou bem

- A mobilização conjunta da equipe para organizar e executar a primeira aula prática foi um sucesso, assim como o esforço na triagem assertiva dos alunos inscritos.

O que precisa melhorar

- O contato ativo com a instituição para evitar falta de informação referente à execução das aulas.

Ação concreta para a próxima sprint

- Organizar o momento de intervalo com lanche comunitário junto à turma.
 - Enviar para a portaria da instituição o nome de cada pessoa envolvida no projeto para evitar conflitos de informações.
-

9. Planejamento da Próxima Sprint

A Sprint 3 (07/05/26 - 20/05/26) terá foco exclusivo no andamento das aulas e suporte logístico.

As tarefas programadas no backlog para esta iteração são:

- Ministrando a Aula 2 e a Aula 3.
- Viabilizar o Lanche comunitário das aulas.
- Coletar assinaturas de imagem dos participantes das aulas 2 e 3.
- Estudar as ferramentas de Inteligência Artificial e Design.
- Definir como será feita a substituição da aula 3 para que não haja perda de conteúdo do projeto.
